

# Weber Ädelputssystem

## Puts på Leca® Lättklinkerelement

### Checklista/egenkontroll/avvikelse rapport

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
Objektsinformation	2
Etablering	3
Mottagningskontroll	4
Ställning	5
Stomme/underlag	6
Nätning elementskarv	7
Plåtarbeten	8
Grundning	9
Nätning av fasaden	10
Putsarbeten	11
Ytputs/färg	12

# Weber Ädelputssystem

## Puts på Leca® Lättklinkerelement

### Förklaring till kvalitetssäkringsdokument

Syftet med detta kvalitetssäkringsdokument är att säkerställa att arbetet med Weber Ädelputssystem Puts på lättklinkerelement sker på föreskrivet sätt. Dokumentet fungerar som en checklista, där de viktigaste punkterna ska kontrolleras av lagbas eller ansvarig putsentreprenör.

### Objektsinformation

Kvarter, fastighet			
Adress			
Fasadentreprenör			
Platsansv/entreprenör			
Kontaktman Weber			
Ansvarig materiallev	Telefon:		
Startdatum			
Färdigställandedatum			
Fasad, bruttoarea	m <sup>2</sup>	Fasad nettoarea:	m <sup>2</sup>

### Åtgärd

Befintlig stomme	
Nyprod/massivstomme	
Renovering	
Puts på isolering	

# Weber Ädelputssystem

## Puts på Leca<sup>®</sup> Lättklinkerelement

### 1. Etablering

- 1.1 Beroende på vilket maskinpaket som ska användas måste ström och vatten finnas tillgängligt. Vissa maskinpaket kräver 32 Amp och ett vattentryck på 3 kg (bar), vattenslang minst 19 mm.
- 1.2 Planera utrymme för maskinutrustning/material.
- 1.3 Väljer man storfickor typ TB 10 eller HTB 10 måste det finnas transportvägar för byte av fickor.
- 1.4 Se till att material alltid är skyddat mot väder och vind på arbetsplatsen.
- 1.5 Mottagningskontroll maskinsystem/material.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign

# Mottagningskontroll

## 2. Mottagning


- 2.1 Mottagningskontroll i enlighet med ABM 07.
- 2.2 Kontrollera att det är rätt material ni fått.
- 2.3 Kontroll av mängd.
- 2.4 Kontroll av kulör av ytputs eller färg.

Orderdatum	Mottaget av	Lev. datum	Avvikelse	Åtgärdsdat	Signatur

## Weber Ädelputssystem Puts på Leca® Lättklinkerelement

### 3. Ställning

- 3.1 Kontrollera att lämplig typ av ställning används och att ställningen placeras/monteras och infästes på korrekt sätt.
- 3.2 Kontrollera att ställningsinfästningarna är anpassade efter isolertjocklek och putsskikt.
- 3.3 Intäckning av ställning beroende av årstid. Vinterväv vid dygnstemperatur under  $+5^{\circ}\text{C}$ , samt uppvärmning. Vid varm väderlek sommarväv, och ALLTID regntak.
- 3.4 Kontrollera att regnvatten från tak etc avleds och inte träffar fasaden.



Se arbetsanvisning för Weber Ädelputssystem Puts på Leca lättklinkerelement.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign

# Weber Ädelputssystem

## Puts på Leca® Lättklinkerelement

### 4. Stomme/underlag

- 4.1 Kontrollera fogarnas bredd, ska vara minst 10 mm, max 30 mm.
- 4.2 Kontrollera och eller montera bottningslist innan fogningen påbörjas.
- 4.3 Kontrollera att fogbruket kommer i hela det yttre lättklinkerskalets tjocklek.
- 4.4 Kontrollera att fogning skett med rätt material.  
(EXM 731/741)

Se arbetsanvisning för Weber Ädelputssystem Puts på Leca lättklinkerelement.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign

# Weber Ädelputssystem

## Puts på Leca® Lättklinkerelement

### 5. Nätning elementskarv

5.1 Kontrollera att nätning skett över samtliga skarvar.

Se arbetsanvisning för Weber Ädelputssystem Puts på Leca lättklinkerelement.


Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign

# Weber Ädelputssystem

## Puts på Leca® Lättklinkerelement

### 6. Plåtarbeten

- 6.1 Det är viktigt att alla plåtarbeten utförs enligt AMA Hus.
- 6.2 Kontrollera att befintliga plåtar är av god kvalitet.
- 6.3 Kontrollera att vattenavrinning kan ske, så det inte träffar fasaden i för stora mängder.

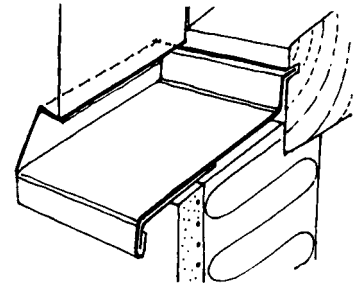

Se arbetsanvisning för Weber Ädelputssystem Puts på Leca lättklinkerelement.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign



# Weber Ädelputssystem

## Puts på Leca<sup>®</sup> Lättklinkerelement

### 7. Grundning

- 7.1 Kontrollera att grundningen är heltäckande.
- 7.2 Kontrollera att det är rätt typ av grundningsbruk som använts.

Se arbetsanvisning för Weber Ädelputssystem Puts på Leca lättklinkerelement.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign

# Weber Ädelputssystem

## Puts på Leca® Lättklinkerelement

### 8. Nätning av fasaden

- 8.1 Kontrollera att nätning har skett över hela fasadytan utanpå grundningen. Alternativt att putsnätet är monterat på distans så att grundningsbruket kan sprutas igenom nätet.
- 8.2 Kontrollera att förstärkningar runt fönster är utfört.
- 8.3 Observera att stålnät monteras innan första skiktet Utstockningsbruk samt att glasfibernät monteras i det första skiktet Utstockningsbruk.

**Ange vilket alternativ.**Glasfibernät i samband med putsskikt 1 Stålnät monterat innan putsskikt 

Se arbetsanvisning för Weber Ädelputssystem Puts på Leca lättklinkerelement.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign

# Weber Ädelputssystem Puts på Leca® Lättklinkerelement

## 9. Putsarbeten

- 9.1 Kontrollera att det är rätt typ av bruk som använts.
- 9.2 Kontrollera att stockningsbruket har påförts i rätt tjocklek/skikt.
- 9.3 Kontrollera att första påslaget bruk omsluter nätet.
- 9.4 Kontrollera att efterfuktning av samtliga putsskikt utförs.


Se arbetsanvisning för Weber Ädelputssystem Puts på Leca lättklinkerelement.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign

# Weber Ädelputssystem Puts på Leca® Lättklinkerelement

## 10. Ytputs/färg

- 10.1 Mottagningskontroll av ytputs/färg.
- 10.2 Ytputs/färg påförs tidigast 5 dygn efter putsningen när putsen har vittorkat.
- 10.3 Kontrollera att för och efterfuktning sker innan och efter ytputs/färg.
- 10.4 Kontrollera att strukturen blir den önskade, att den är enhetlig och inga bomlagsskarvar förekommer.
- 10.5 Gör en avsyning av fasaden innan ställningen rivs.



Se arbetsanvisning för Weber Ädelputssystem Puts på Leca lättklinkerelement.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign
