

# Weber Kalkbrukssystem Reveteringsmatta Checklista/egenkontroll/avvikelse rapport

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
Objektsinformation/förklaring	2
Etablering	3
Mottagningskontroll	4
Ställning	5
Stomme/underlag	6
Plåtarbeten	7
Grundning	8
Putsarbeten	9
Ytputs/färg	10

# Weber Kalkbrukssystem Reveteringsmatta

## Förklaring till kvalitetssäkringsdokument

Syftet med detta kvalitetssäkringsdokument är att säkerställa att arbetet med Weber Kalkbrukssystem reveteringsmatta sker på föreskrivet sätt. Dokumentet fungerar som en checklista, där de viktigaste punkterna ska kontrolleras av lagbas eller ansvarig putsentreprenör.

## Objektsinformation

Kvarter, fastighet			
Adress			
Fasadentreprenör			
Platsansv/entreprenör			
Kontaktman Weber			
Ansvarig materiallev	Telefon:		
Startdatum			
Färdigställandedatum			
Fasad, bruttoarea	m <sup>2</sup>	Fasad nettoarea:	m <sup>2</sup>

## Åtgärd

Befintlig stomme	
Nyprod/massivstomme	
Renovering	
Puts på isolering	

# Weber Kalkbrukssystem

## Reveteringsmatta

### 1. Etablering

- 1.1 Beroende på vilket maskinpaket som ska användas måste ström och vatten finnas tillgängligt. Vissa maskinpaket kräver 32 Amp och ett vattentryck på 3 kg (2 bar), vattenslang minst 19 mm.
- 1.2 Planera utrymme för maskinutrustning/material.
- 1.3 Väljer man storfickor typ TB 10 eller HTB 10 måste det finnas transportvägar för byte av fickor.
- 1.4 Se till att material alltid är skyddat mot väder och vind på arbetsplatsen.
- 1.5 Mottagningskontroll maskinsystem/material.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign

# Mottagningskontroll

## 2. Mottagning


- 2.1 Mottagningskontroll i enlighet med ABM 07.
- 2.2 Kontrollera att det är rätt material ni fått.
- 2.3 Kontroll av mängd.
- 2.4 Kontroll av kulör av ytputs eller färg.

Orderdatum	Mottaget av	Lev. datum	Avvikelse	Åtgärdsdat	Signatur

# Weber Kalkbrukssystem Reveteringsmatta

## 3. Ställning

- 3.1 Kontrollera att lämplig typ av ställning används och att ställningen placeras/monteras och infästes på korrekt sätt.
- 3.2 Kontrollera att ställningsinfästningarna är anpassade efter isolertjocklek och putsstikt.
- 3.3 Intäckning av ställning beroende av årstid. Vinterväv vid dygnstemperatur under +5°C, samt uppvärmning. Vid varm väderlek sommarväv, och ALLTID regntak.
- 3.4 Kontrollera att regnvatten från tak etc avleds och inte träffar fasaden.



Se arbetsanvisning för Weber Kalkbrukssystem Reveteringsmatta.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign

# Weber Kalkbrukssystem

## Reveteringsmatta

### 4. Stomme/underlag

- 4.1 Kontrollera den befintliga reveteringsmattan och pappen efter borthuggning av puts. Byt dessa om de är dåliga.
- 4.2 Kontrollera infästning av befintlig reveteringsmatta om denna ska vara kvar.
- 4.3 Kontrollera infästning av den nya reveteringsmattan om den är utbytt.
- 4.4 Kontrollera att det inte finns rötskador i stommen.


Se arbetsanvisning för Weber Kalkbrukssystem Reveteringsmatta.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign

# Weber Kalkbrukssystem Reveteringsmatta

## 5. Plåtarbeten

- 5.1 Det är viktigt att alla plåtarbeten utförs enligt hus AMA.
- 5.2 Kontrollera att befintliga plåtar är av god kvalitet.
- 5.3 Kontrollera att vatten avrinning kan ske så det inte träffar fasaden i för stora mängder.

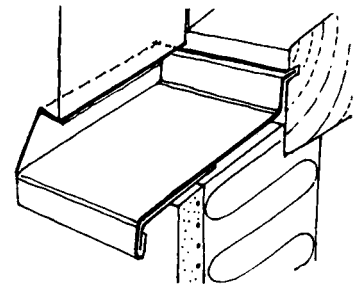

Se arbetsanvisning för Weber Kalkbrukssystem Reveteringsmatta.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign

# Weber Kalkbrukssystem Reveteringsmatta

## 6. Grundning

- 6.1 Kontrollera att grundningen är utförd.
- 6.2 Kontrollera att det är rätt typ av grundningsbruk som använts.

Se arbetsanvisning för Weber Kalkbrukssystem Reveteringsmatta.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign



# Weber Kalkbrukssystem

## Reveteringsmatta

### 7. Putsarbeten

- 7.1 Kontrollera att det är rätt typ av bruk som använts.
- 7.2 Kontrollera att stockningsbruket har påförts i rätt tjocklek/skikt.  
Total tjocklek minst 30 mm.
- 7.3 Kontrollera att eftervattning av samtliga putsskikt utförs.

Se arbetsanvisning för Weber Kalkbrukssystem Reveteringsmatta.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign

# Weber Kalkbrukssystem

## Reveteringsmatta

### 8. Ytputs/färg

- 8.1 Mottagningskontroll av ytputs/färg.
- 8.2 Ytputs/färg påförs tidigast 5 dygn efter putsning när putsen har vittorkat.
- 8.3 Kontrollera att för och efterfuktning sker innan och efter ytputs/färg.
- 8.4 Kontrollera att strukturen blir den önskade, att den är enhetlig och inga bomslagsskarvar förekommer.
- 8.5 Gör en avsyning av fasaden innan ställningen rivs.

Se arbetsanvisning för Weber Kalkbrukssystem Reveteringsmatta.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign
