

# Weber Ädelputssystem

## Puts på lättbetong

### Checklista/egenkontroll/avvikelse rapport

#### **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

#### **SIDA**

Objektsinformation	2
Etablering	3
Mottagningskontroll	4
Ställning	5
Stomme/underlag	6
Plåtarbeten	7
Grundning	8
Nätning	9
Putsarbeten	10
Ytputs/färg	11

# Weber Ädelputssystem

## Puts på lättbetong

### Förklaring till kvalitetssäkringsdokument

Syftet med detta kvalitetssäkringsdokument är att säkerställa att arbetet med Weber Ädelputssystem puts på lättbetong sker på föreskrivet sätt. Dokumentet fungerar som en checklista, där de viktigaste punkterna ska kontrolleras av lagbas eller ansvarig putsentreprenör.

### Objektsinformation

Kvarter, fastighet			
Adress			
Fasadentreprenör			
Platsansv/entreprenör			
Kontaktman Weber			
Ansvarig materiallev	Telefon:		
Startdatum			
Färdigställandedatum			
Fasad, bruttoarea	m <sup>2</sup>	Fasad nettoarea:	m <sup>2</sup>

### Åtgärd

Befintlig stomme	
Nyprod/massivstomme	
Renovering	
Puts på isolering	



# Mottagningskontroll

## 2. Mottagning

- 2.1 Mottagningskontroll i enlighet med ABM 07.
- 2.2 Kontrollera att det är rätt material ni fått.
- 2.3 Kontroll av mängd.
- 2.4 Kontroll av kulör av ytputs eller färg.

Orderdatum	Mottaget av	Lev. datum	Avvikelse	Åtgärdsdat	Signatur



# Weber Ädelputssystem

## Puts på lättbetong

### 4. Stomme/underlag

- 4.1 Kontrollera murverket är utfört enligt leverantörens anvisningar.
- 4.2 Kontrollera att tunnfgsbruket/murbruket har fyllt fogarna väl.
- 4.3 Följ leverantörens anvisningar om uttorkning av stommen innan putsarbete påbörjas.

Se arbetsanvisning för Weber Ädelputssystem Puts på lättbetong.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign



# Weber Ädelputssystem

## Puts på lättbetong

### 6. Grundning

- 6.1 Kontrollera att grundningen är heltäckande.
- 6.2 Kontrollera att det är rätt typ av grundningsbruk som använts (låg alkaliskt bruk).

Se arbetsanvisning för Weber Ädelputssystem Puts på lättbetong.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign








# Weber Ädelputssystem

## Puts på lättbetong

### 9. Ytputs/färg

- 9.1 Mottagningskontroll av ytputs/färg
- 9.2 Ytputs/färg påförs tidigast 5 dygn efter putsning när putsen har vittorkat.
- 9.3 Kontrollera att för och efterfuktning sker innan och efter ytputs/färg.
- 9.4 Kontrollera att strukturen blir den önskade, att den är enhetlig och inga bomlagsskarvar förekommer.
- 9.5 Gör en avsyning av fasaden innan ställningen rivs.

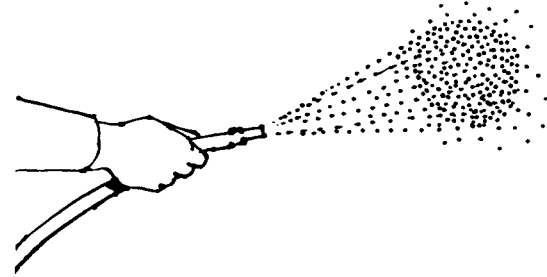

Se arbetsanvisning för Weber Ädelputssystem Puts på lättbetong.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign
