

# Weber Ädelputssystem

## Renovering

### Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
Objektsinformation	2
Etablering	3
Mottagningskontroll	4
Ställning	5
Stomme/underlag bomknackning, rengöring	6
Plåtarbeten	7
Putsarbeten	8
Ytputs/färg	9

# Weber Ädelputssystem Renovering

## Förklaring till kvalitetssäkringsdokument

Syftet med detta kvalitetssäkringsdokument är att säkerställa att arbetet med Weber Ädelputssystem Renovering sker på föreskrivet sätt. Dokumentet fungerar som en checklista, där de viktigaste punkterna ska kontrolleras av lagbas eller ansvarig putsentreprenör.

## Objektsinformation

Kvarter, fastighet			
Adress			
Fasadentreprenör			
Platsansv/entreprenör			
Kontaktman Weber			
Ansvarig materiallev	Telefon:		
Startdatum			
Färdigställandedatum			
Fasad, bruttoarea	m <sup>2</sup>	Fasad nettoarea:	m <sup>2</sup>

## Åtgärd

Befintlig stomme	
Nyprod/massivstomme	
Renovering	
Puts på isolering	

# Weber Ädelputssystem

## Renovering

### 1. Etablering

- 1.1 Beroende på vilket maskinpaket som ska användas måste ström och vatten finnas tillgängligt. Vissa maskinpaket kräver 32 Amp och ett vattentryck på 3 kg (2 bar), vattenslang minst 19 mm.
- 1.2 Planera utrymme för maskinutrustning/material.
- 1.3 Väljer man storfickor typ TB 10 eller HTB 10 måste det finnas transportvägar för byte av fickor.
- 1.4 Se till att material alltid är skyddat mot väder och vind på arbetsplatsen.
- 1.5 Mottagningskontroll maskinsystem/material.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign

# Mottagningskontroll

## 2. Mottagning


- 2.1 Mottagningskontroll i enlighet med ABM 07.
- 2.2 Kontrollera att det är rätt material ni fått.
- 2.3 Kontroll av mängd.
- 2.4 Kontroll av kulör av ytputs eller färg.

Orderdatum	Mottaget av	Lev. datum	Avvikelse	Åtgärdsdat	Signatur

# Weber Ädelputssystem Renovering

## 3. Ställning

- 3.1 Kontrollera att lämplig typ av ställning används och att ställningen placeras/monteras och infästes på korrekt sätt.
- 3.2 Kontrollera att ställningsinfästningarna är anpassade efter isolertjocklek och putsskikt.
- 3.3 Intäckning av ställning beroende av årstid. Vinterväv vid dygnstemperatur under +5°C, samt uppvärmning. Vid varm väderlek sommarväv, och ALLTID regntak.
- 3.4 Kontrollera att regnvatten från tak etc avleds och inte träffar fasaden.



Se arbetsanvisning för Weber Ädelputssystem Renovering.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign

# Weber Ädelputssystem Renovering

## 4. Stomme/underlag bomknackning, rengöring

- 4.1 Kontrollera att alla sprickor är upphuggna och löst sittande puts är borttagen.
- 4.2 Kontrollera att rengöring av befintlig putsyta är god och utförd på ett korrekt sätt genom t ex. blästring eller högtryckstvättning.
- 4.3 Kontrollera att eventuell omfogning/komplettering skett samt eventuella extra åtgärder vid tidigare sprickor i fasaden.
- 4.4 Kontrollera eventuell befintlig armering. Byt/komplettera om det behövs.


Se arbetsanvisning för Weber Ädelputssystem Renovering.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign

# Weber Ädelputssystem Renovering

## 5. Plåtarbeten

- 5.1 Det är viktigt att alla plåtarbeten utförs enligt AMA Hus.  
 5.2 Kontrollera att befintliga plåtar är av god kvalitet.  
 5.3 Kontrollera att vatten avrinning kan ske så det inte träffar fasaden i för stora mängder.

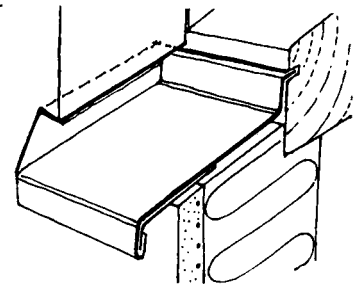

Se arbetsanvisning för Weber Ädelputssystem Renovering.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign

# Weber Ädelputssystem Renovering

## 6. Putsarbeten

- 6.1 Kontrollera att grundningsbruket är heltäckande och av rätt typ.
- 6.2 Kontrollera att stockningsbruket har påförts i rätt tjocklek/skikt.
- 6.3 Kontrollera att lagningar har rätt struktur och är ihopskurade på ett bra sätt med befintlig puts.
- 6.4 Kontrollera att eftervattning av samtliga putsskikt utförs.

Se arbetsanvisning för Weber Ädelputssystem Renovering.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign



# Weber Ädelputssystem

## Renovering

### 7. Ytputs/färg

- 7.1 Mottagningskontroll av ytputs/färg.
- 7.2 Ytputs/färg påförs tidigast 5 dygn efter putsning när putsen har vittorkat.
- 7.3 Kontrollera att för-och efterfuktning sker innan och efter ytputs/färg.
- 7.4 Kontrollera strukturen blir den önskade och att den är enhetlig och inga bomslagsskarvar förekommer.
- 7.5 Gör en avsyning av fasaden innan ställningen rivs.

Se arbetsanvisning för Weber Ädelputssystem Renovering.

Fasadyta	Punkt	Kontrolldat.	Avvikelse	Åtgärdsdat.	Sign
